


7. Phasage et cahier d'exécution

Pour certains chantiers, notamment les opérations de grande envergure ou les chantiers partiellement sous-traités, il est nécessaire de découper l'affaire en plusieurs **phases d'exécution**.

Le cahier d'exécution permet d'organiser ces phases, aussi bien pour la **main d'œuvre** que pour les **approvisionnements**.

☐ Cahier d'exécution – Main d'œuvre




Pour créer ou modifier les phases d'exécution de la main d'œuvre, cliquez sur l'icône **Cahier d'exécution** située en haut à droite du tableau de suivi de chantier.



☐ Phase par défaut

Par défaut, le chantier n'est pas découpé.

Une seule phase de main d'œuvre est créée et regroupe l'ensemble des heures prévues au devis.

Main d'œuvre				+ Ajouter
PHASE	DATE DE MODIFICATION	MONTEUR(S)	TEMPS PREVU	
Phase 1 : 1	26/03/2024		860.05 h.	  

⇌ Modifier la première phase

Pour créer plusieurs phases, il est nécessaire de commencer par modifier la phase existante.

Ouvrez la phase 1 en modification, puis supprimez les lignes que vous ne souhaitez pas conserver dans cette phase.

Commande principale					
POSTE	DESIGNATION	QTE	RENDEMENT	TEMPS DE POSE	
1- PRESTATIONS D'ETUDES					
1.10		1.00 U.	20.00	20.00 h	
1.20		1.00 U.	10.00	10.00 h	
1.30		1.00 U.	10.00	10.00 h	
1.40		1.00 U.	5.00	5.00 h	
2- TRAVAUX DE DEPOSE					
2.11		1.00 Ens.	40.00	40.00 h	
2.12		1.00 Ens.	25.00	25.00 h	
2.21		1.00 Ens.	50.00	50.00 h	
2.22		1.00 Ens.	20.00	20.00 h	
2.31		1.00 Ens.	32.00	32.00 h	

☐ Créer une nouvelle phase

Une fois la première phase ajustée, revenez à la liste des phases à l'aide du fil d'Ariane, puis cliquez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle phase.

Nouvelle phase main d'oeuvre

Phase 2 :

Partie du chantier traitée par cette phase (obligatoire)

Monteur(s) :

Créer une ligne pour chaque poste

[Créer une nouvelle phase](#)

Si l'option **Créer une ligne pour chaque poste** est activée, la nouvelle phase est automatiquement alimentée avec les lignes du devis non encore entièrement affectées à une autre phase.

⚙️ Ajuster les heures par poste

Pour affiner le contenu d'une phase, cliquez sur **Modifier** afin d'ouvrir le détail d'un poste.

Affaire n°240908RT-03S - Phase d'exécution n°2

Poste 2.12 : main d'oeuvre

Désignation :

Dépose plafond local 041 avec renfort si nécessaire des suspentes
Surface 17m²

	Devis	Autres phases	Cette phase
Quantité :			<input type="text" value="1.00"/> Ens.
Rendement :			<input type="text" value="25.00"/> h. / Ens.
Temps de pose :			<input type="text" value="25"/> h.

Enregistrer

Depuis cette fenêtre, il est possible de modifier :

- La quantité,
- Le rendement,
- Le nombre d'heures.


Lorsqu'une valeur est modifiée, les autres se recalculent automatiquement.

Ce fonctionnement permet de :

- Découper un poste en plusieurs étapes,
- Ajuster les heures prévues pour un sous-traitant,
- Affiner le pilotage du chantier.

☐ Créer une commande de sous-traitance depuis une phase

Depuis le détail d'une phase d'exécution, il est possible de créer directement une commande de sous-traitance en cliquant sur l'icône **Créer une commande de sous-traitance**.

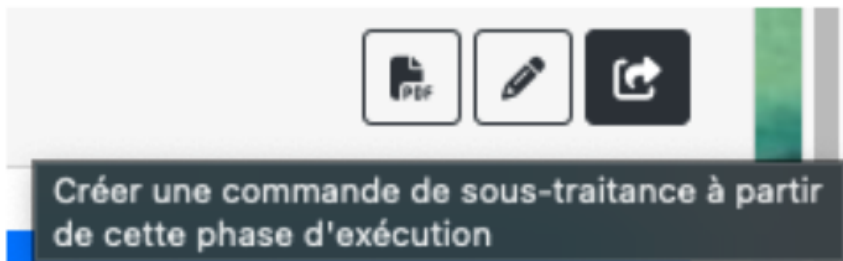

La commande est alors pré-remplie avec une ligne par poste.

Les montants proposés correspondent aux heures renseignées, multipliées par le taux horaire du devis.

La commande est ensuite visible :

- Dans l'onglet **Suivi des heures > Sous-traitance**,
- Dans la **synthèse financière** de l'affaire.

Cahier d'exécution - Approvisionnements

Le phasage peut également être appliqué aux approvisionnements afin d'organiser les livraisons de fournitures dans le temps.


La méthode est identique à celle utilisée pour la main d'œuvre :

- Modification de la phase initiale,
- Création de nouvelles phases,
- Ajustement des lignes par phase.

Phases d'approvisionnement et suivi

Pour chaque phase d'approvisionnement, un onglet spécifique est créé dans le **Suivi des approvisionnements**.

Lorsqu'il existe plusieurs phases, un onglet **Total** permet d'avoir une vision globale.

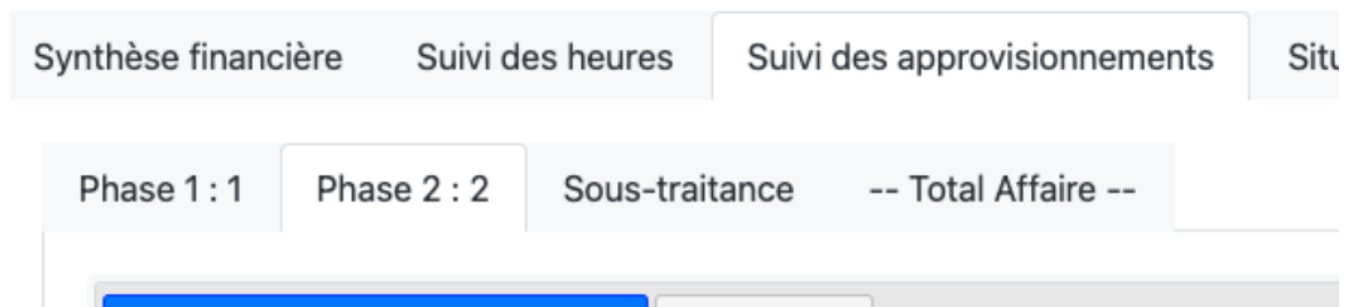

Chaque phase affiche :

- La liste des fournitures nécessaires,

- Les commandes d'approvisionnement associées à cette phase.
-

Révision #1

Créé 2026-02-09 19:28:40 UTC par Anton RIVIERE

Mis à jour 2026-02-09 19:35:47 UTC par Anton RIVIERE
